


CONTROL DIARIO DE PERFORACION

AREA <i>Lobitos Cortadera</i>	NUMERO OFICIAL DEL POZO <i>Z2A-21-795-D-1016</i>	Nº DE PETROMAR <i>1016-11</i>	TIPO DE POZO <i>Desarrollo</i>	EQUIPO <i>VIII</i>
----------------------------------	---	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------

OBJETIVO PRIMARIO: *Basal Salina*
SECUNDARIO:

T I E M P O

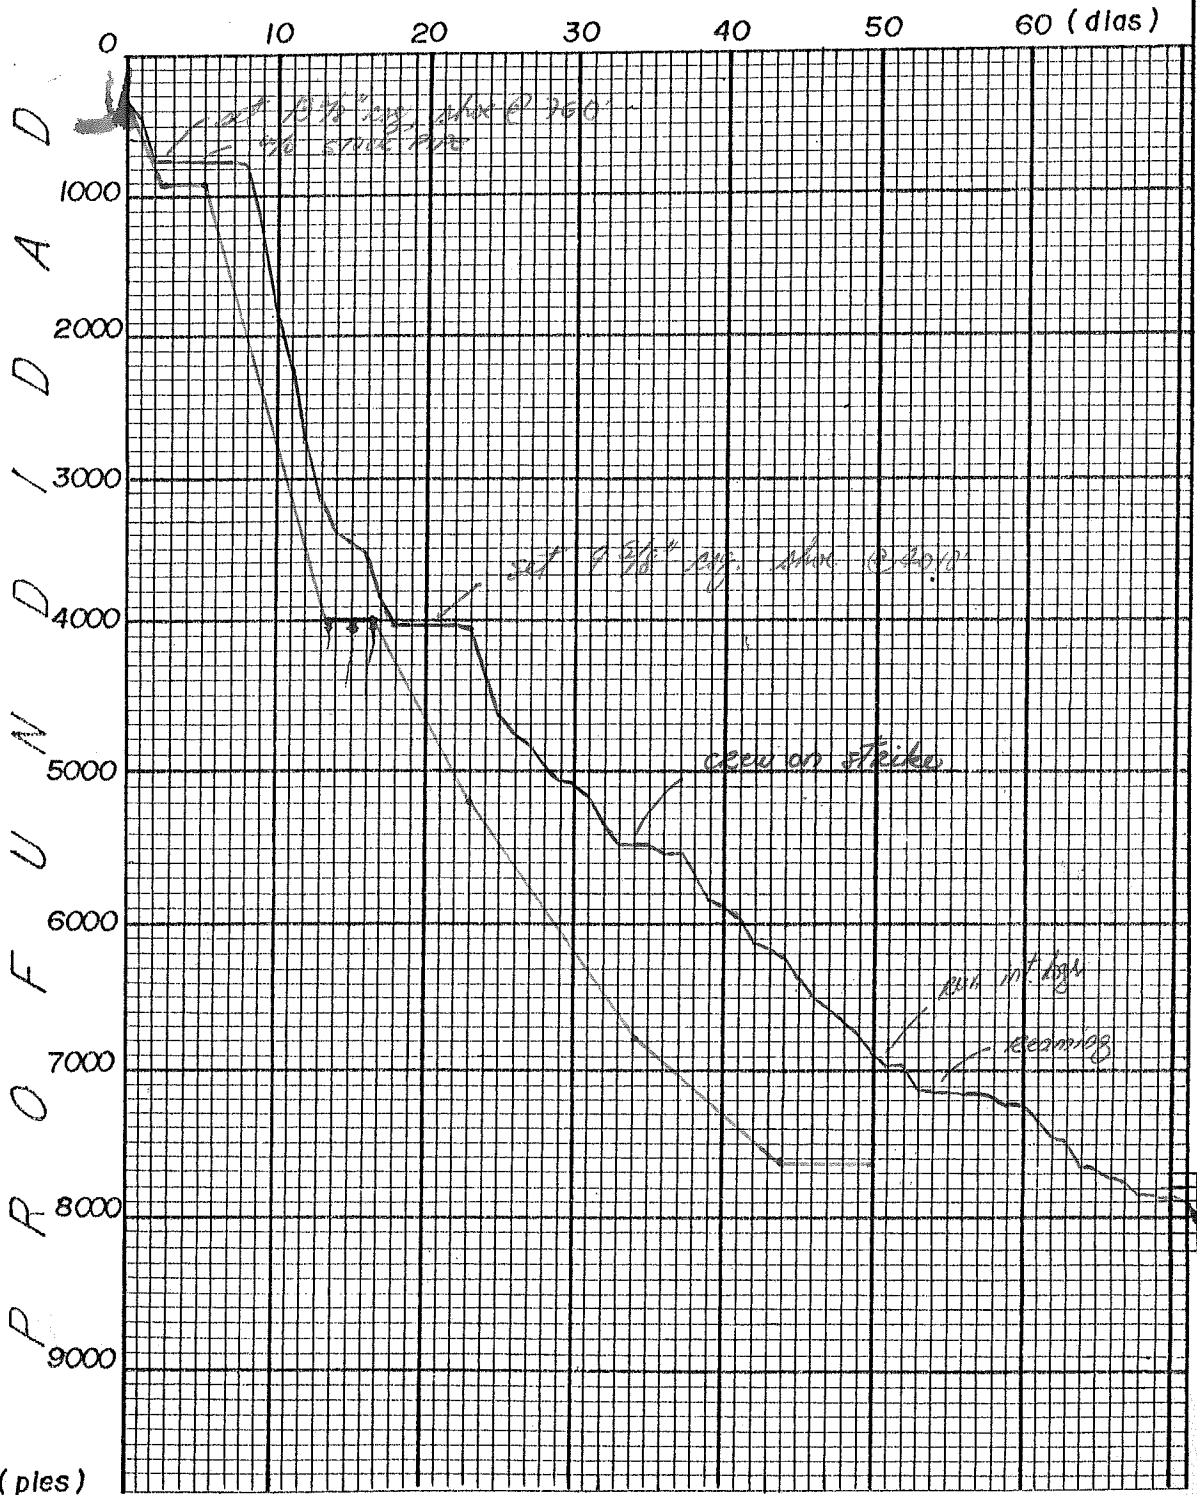

TERMINO DE LA PERF.

TMD
8010'
(-7534' ss)

CONTROLADO POR:

COMENZO *12-09-90*

FECHA:

PERF.

TERMINO *23-11-90*

MERSVYR.

TOTAL DE DIAS ESTIMADOS DE PERFORACION: 44
Se utilizaron 28 días más de los estimados de perforación. (64% +)



TOTAL DE DIAS DE PERFORACION: 78
TOTAL DE DIAS CON AVANCE DE PERF.: 58
TOTAL DE DIAS SIN AVANCE DE PERF.: 14
(CINERIA AGRIADA; fraguado cemento; huelas; corrida de registro intermedio; rimando)

81%
19%
